

2024年12月1日(日)

スプラウト 曳舟大規模修繕工事

居住者説明会資料



思いやりのある 人にやさしい工事



クリステル工業株式会社

目次 table of contents

工事概要	1
弊社について	2
現場管理体制	6
安全品質管理	8
工程表(案)	12
仮設計画図(案)	14
仮設計画のポイント	16
工事期間中のお知らせ	17
アフターメンテナンス	19
工事保険	22
工事内容について	25



思いやりのある 人にやさしい工事

クリステル工業株式会社

工事概要

Construction Overview

工事名

スプラウト曳舟 大規模修繕工事

工事場所

東京都墨田区京島3-8-7

建物規模

RC造 5階 A棟20戸・B棟16戸 2013年竣工

発注者

スプラウト曳舟管理組合

管理会社

保全工業株式会社

工事期間

未定(4ヶ月工期予定)

工事種目

- | | |
|------------|-----------|
| 1. 共通仮設工事 | 5. 塗装工事 |
| 2. 直接仮設工事 | 6. 鉄部塗装工事 |
| 3. 下地補修工事 | 7. 防水工事 |
| 4. シーリング工事 | 8. その他工事 |

会社概要

社 名	クリステル工業株式会社
本 社 所 在 地	東京都中野区弥生町2-3-10
創 業 年 月 日	昭和16年10月1日
資 本 金	5,000万円
建 設 業 許 可	東京都知事許可(特-2)第101779号 防水工事業、塗装工事業、建築工事業 大工工事業、左官工事業、とび・土工事業 屋根工事業板金工事業、内装仕上工事業 建具工事業、タイル・れんが・ブロック工事業
事 務 所 登 録	一級建築士事務所 第56918号
有 資 格 者	一級建築士 1名 二級建築士 2名 一級建築施工管理技士 8名 一級建築施工管理技士補 2名 二級土木施工管理技士 1名 二級建築施工管理技士 2名
I S O 認 証	JIS Q 9001:2015【ISO9001:2015】
事 業 内 容	建物調査診断 大規模修繕工事 総合防水工事 アスファルト防水 ウレタン塗膜防水 ポリマーセメント防水 シーリング防水 各種シート防水 各種下地補修工事 塗装工事 他

お客様にご満足いただける仕事をしたいため

❖ 思いやりのある 人にやさしい工事

作業員による居住者様へのご挨拶はもちろん、社員ひとりひとりが自分の家・財産という考えのもと、工事を行っています。

❖ 歴史が物語る体制づくり

創業82周年を迎えた弊社は自社作業員の他、弊社の仕事で生計を立てている仲間が数多くおります。

彼らは長い歴史の中でチームとしての関係を培ってきた仲間たちです。

❖ 自社施工へのこだわり

シーリング、下地補修、タイル施工、防水など各工種のスペシャリストを育成し規模修繕工事を自社施工で完結することを目指し邁進しております。

❖ 高品質・低価格の安定した施工(ISO9001品質方針より)

日本を代表する材料メーカーの組合に加盟することで、代理店を通さずに材料を購入したり、組合員のみの特典な工法もご提供することができます

❖ 新築工事継続中

修繕工事において、弊社が最も大切だと考えることは

『ビル・マンションが完成するその過程を熟知しているかどうか』です。

地下の水止め工事から始まり、各フロアのシーリング・防水工事まで更地の段階からの建築に携わっており、この体制は今後も継続します。

感謝状



ラディエンス世田谷若林大規模修繕工事



クレセント南品川大規模修繕工事

加盟団体

マンションほか関連団体(マンション大規模修繕工事の団体)

マンション計画修繕施工協会 (MKS.A 旧略称「MKS」)

住宅リフォーム事業者団体登録制度の第1号登録団体であり、消費者に安心していただけるよう適正な運営と情報提供を行っています。

この制度は一定の要件を満たす事業者団体を国が登録し、住宅リフォーム事業の健全な発展と消費者が安心してリフォームを依頼できる環境の整備を目指しています。

防水・塗装・外壁補修工事業団体(関連業界の公的な組合)

全国防水工事業協会	防水業者総合団体
東京都塗装工業協同組合	東京都の塗装業者総合団体
東京都防水工事業協会	東京都の防水業者総合団体
東日本シーリング工事業協同組合	シーリング専門団体
全国ビルリフォーム工事業協同組合	外壁補修業者総合団体
日本樹脂施工協同組合	外壁補修業者総合団体

材料メーカー組織団体(組合加入によるメーカーからの直仕入・保証)

東西アスファルト事業協同組合	田島ルーフィングの新築アスファルト防水団体
関東防水管理事業協同組合	田島ルーフィングの改修防水団体
ダイフレックス防水工事業協同組合	ウレタン防水トップメーカー団体
コニシシステム工業会	外壁改修トップメーカー団体
アサヒボンド工業会	外壁下地補修専門団体
全アロン防水組合(略称)	特殊外壁防水施工団体
ロンブルー防水事業協同組合	塩ビシートトップメーカー団体
サンロイドDN工業会	特殊塩ビシート施工団体
全国イーテック防水工業会	特殊アスファルト防水施工団体
関東ペンギン会	シーリングメーカー団体
全国パラテックス防水工事業協同組合	地下防水関連メーカー団体
全国セリノール防水事業協同組合	地下防水関連メーカー団体

近隣・同規模施工実績

墨田フラワーマンション(墨田区八広)
SRC造11階43戸



近隣施工実績

日神パレスステージ本所吾妻橋
(墨田区吾妻橋) SRC造13階36戸



近隣施工実績

Dクラディア川口戸塚(埼玉県川口市)
RC造5階37戸



同規模施工実績

スカーラ代々木上原(渋谷区上原)
RC造5階23戸



同規模施工実績

コート田無グリーンテラス
(西東京市芝久保町) RC造6階36戸



同規模施工実績

オーベル柏の葉ヒルズ式番館
(千葉県柏市花野井) RC造6階38戸



同規模施工実績

【直近 請負金額5000万円以上物件】 (抜粋)

工事名	棟数	階数	戸数	工事期間	請負金額	所在地	区別
コート田無グリーンテラス大規模修繕工事	1棟	6階	36戸	2024年 1月～2024年 5月	54,000,000	西東京市	元請
クレセント商品川大規模修繕工事	1棟	8階	83戸	2023年 10月～2024年 2月	76,140,000	品川区	元請
セルシティオ立川大規模修繕工事	1棟	9階	42戸	2023年 8月～2023年 12月	55,500,000	立川市	元請
学芸大ハイツ大規模修繕工事	1棟	11階	66戸	2023年 1月～2023年 7月	60,300,000	目黒区	下請
互恵板橋ハイム大規模修繕工事	1棟	10階	52戸	2023年 1月～2023年 6月	99,830,000	北区	元請
文京ハイツ大規模修繕工事	1棟	13階	63戸	2022年 4月～2022年 9月	57,500,000	文京区	下請
ニュー青葉台マンション大規模修繕工事	1棟	7階	24戸	2022年 2月～2022年 8月	53,860,000	目黒区	下請
コアマンション東京ベントレイ大規模修繕工事	1棟	15階	47戸	2021年 5月～2021年 10月	64,650,000	大田区	元請
オーベル柏の葉ヒルズ四番館大規模修繕工事	1棟	7階	73戸	2021年 2月～2021年 7月	81,020,000	柏市	元請
リレント早稲田大規模修繕工事	1棟	5階	78戸	2021年 1月～2021年 6月	66,900,000	豊島区	下請

発注者

スプラウト曳舟管理組合 様

管理会社

保全工業株式会社

施工会社	クリステル工業株式会社	
	代表取締役	吉岡 諒伍
工事総責任者	工事部部长	須貝 数人
現場代理人	未定	
担当営業	営業技術部 部長	羽賀 謙次

施工会社・直庸工・協力業者

仮設工事

各所長・作業員

下地補修工事

各所長・作業員

シーリング工事

各所長・作業員

塗装工事

各所長・作業員

防水工事

各所長・作業員

その他工事

各所長・作業員

現場関係者

未定

工事総責任者

工事部 部長



須貝 数人

本工事の工事総責任者を務めさせていただきます

【保有資格】

監理技術者

(第0002110633号)

一級建築施工管理技士 (番号 B091001928) 他

安全大会の実施

毎年社員・作業員が集まり安全大会を行います。事故事例の共有や法令改正などの最新情報を共有し、一丸となって安全衛生に対する意識を高め、労働災害を防ぎます。

安全衛生計画の基づく安全管理の徹底

現場担当者と作業員は安全衛生計画に基づき

『死亡災害ゼロ、墜落災害の撲滅、安全帯使用率100%達成』を目標に、安全に対する事項に日々取り組んでいます。

リスクアセスメントと危険予知活動

作業員は朝礼時にリスクアセスメントと危険予知活動(KYK)を行い一日の危険作業の報告をします。危険作業を行う場合は、対策案を打ち出し、安全な工事の実施に努めます。

送り出し教育の実施

現場への送り出し教育を行い、修了者のみで作業いたします。

安全品質パトロールの実施

安全品質管理担当者と弊社社員が、ISOの自主検査表に沿って現場のパトロールを実施します。是正がある場合、現場代理人に改善命令を出し是正処置を実施させます。



安全大会



安全品質パトロール

品質管理について

ISO認証取得・更新

2003年よりISO9001:2015の取得後
現在も継続し、JIS企画に適合した
高品質な工事を行います。

登録証



登録番号: 0000
登録日: 2015年10月13日
更新日: 2017年10月13日
有効期限: 2021年10月13日

クリステル工業株式会社

住所
東京都東大塚5-10-10
其の他の品質マネジメントシステムは、本社の管理の範囲
JIS Q 9001:2015 (ISO 9001:2015)

の要求事項に適合していることが証明されます。

<注釈事項>
1. 設計、開発、生産プロセスの監査

2. 組織上の変更管理の適用により、

本証は、本証の発行日から1年以内の更新を要するものとされています。



エイエスアール株式会社
東京都中央区日本橋大塚5-10-10
上越建設株式会社
朝倉 善智

品質方針

確かな技術力とチームワークにより、高品質・低価格の安定した
施工を実現し お客様の信頼と満足を得て、社会に貢献し発展する。

品質管理の実施

品質管理方針に基づき現場や施工の品質維持と向上に努めます。

検査項目		検査立合者	管理組合	クリステル工業株式会社			
				現場代理人	工事総責任者	職長	作業員
着工前	着前検討会		○	○	○	○	
施工中	定例打合せ	○	○	△			
	自主社内検査		○	○	○	△	
竣工前	社内検査		○	○	○	△	
	竣工前検査	○	○	○	○	△	
竣工時	竣工検査	○	○	○	○	△	
竣工後	アフター点検	○	○	○	○		

工事関係者の識別

不審な人物が一目で判断できるように、現場内では弊社オリジナルのヘルメット等を活用し、識別を図ります。

ビブス



現場代理人



職長・作業員

ヘルメット



現場代理人



職長



作業員

防犯対策例

補助錠の設置



窓のアルミサッシに補助錠を設置することで、防犯効果があがります。こちらは無償で提供いたします。

警報装置看板（ダミー）の設置



足場メッシュシートが目立つ箇所に「足場内防犯警報システム」のダミー看板を設置し、不審者の侵入を防止します。

その他居住者様への留意

現場の清掃



工事期間中は週1回以上の清掃を行い美観を保ちます。

各所の養生について



作業する全てのスペースに、養生をいたします。
ご通行の際は足元にお気を付けください。

拭き上げ清掃



作業中についた各所汚れは、その都度拭き上げを行います。

作業員のマナー



作業員は無駄な大声、決められた場所以外での喫煙をしません。

騒音・排気ガスへの配慮



作業車等の搬入出時アイドリングをしません。

使用材料の選定



原則F☆☆☆☆(環境対応最上位規格)の材料を使用しています。
SDS(化学物質等安全データシート)でアレルギーにも配慮しています。

工程表(案) Construction Schedule


工程表(案)		工事名		所在地																																																									
		スプラウト曳舟 大規模修繕工事		東京都墨田区京島3-8-7																																																									
		構造	RC造 5階	36戸	作成日	2024年11月29日																																																							
		工期	4ヶ月工期		施工会社	クリステル工業株式会社																																																							
工程	日付	1ヶ月目							2ヶ月目							3ヶ月目							4ヶ月目																																						
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
準備工事		諸官庁申請手続き着工1か月前迄に申請																																																											
1	共通仮設工事	現場事務所・詰所整備 各所養生・提示板設置																												現場事務所・詰所片付		養生撤去・片付・清掃																													
2	直接仮設工事	仮設足場設置 3309.9㎡																	仮設足場設置期間(117日)											仮設足場解体			完																												
3	下地補修工事【塗装面】	下地マーキング調査							外壁塗装面補修(ひび割れ、欠損、爆裂補修、浮き部アンカーピン注入等)※補修後洗浄																																																				
	下地補修工事【タイル面】	下地マーキング調査							外壁タイル面下地補修(タイル貼替、浮き部アンカーピンニング工法等)※補修後洗浄																																																				
4	シーリング工事	各所シーリング工事																																																											
5	外壁塗装工事	外壁塗装(微弾性フィラー・超低汚染セラミックハイブリッドシリコン樹脂)																																																											
6	鉄部塗装工事	鉄部塗装(ケレン・エポキシ樹脂錆止め・弱溶剤シリコン樹脂2回)																																																											
7	防水工事【屋上】	A棟屋上庭園撤去・搬出																	屋上笠木ウレタン塗膜防水																																										
	防水工事【ルーフバルコニー】	B棟ルーフバルコニー庭園撤去・搬出																	ルーフバルコニー笠木ウレタン塗膜防水																																										
	防水工事【バルコニー】 【廊下・階段他】	バルコニー(長尺シート+ウレタン塗膜防水) 廊下(端末シール打替え)、階段(側溝ウレタン塗膜防水)																																																											
8	その他工事																									クリーニング							渡																												
騒音・振動作業		※足場組立作業及び下地補修工事の際、騒音・振動・埃が発生いたします。																	※足場解体作業の際、騒音が発生いたします。							し																																			
臭気作業		※シンナー等の臭いが発生いたします。																																																											
検査関連		工事着工																																																											
備考		※ 作業日・作業時間は原則として日曜日、祝日以外とし、時間は午前8時30分から午後5時30分までといたします。 ※ バルコニー内の工事では居住者様の出入り制限及び洗濯物干しが出来ない期間がございます。その都度チラシ・お知らせ等でご案内申し上げます。 ※ 気象状況により各工事項目・工事箇所・工事工程が変更となる場合もございます。ご理解の程お願い申し上げます。 ※ 工程上またその他の理由によりやむを得ず変更する場合は管理組合・管理者と協議の上その都度取決めを行うものといたします。																																																											

仮設計画図(案) Temporary Construction Plan

仮設設置場所については
管理組合様と協議の上決定いたします。

【凡例】

外部足場	
昇降階段	
朝顔養生	
搬入出車輛	
交通誘導員	

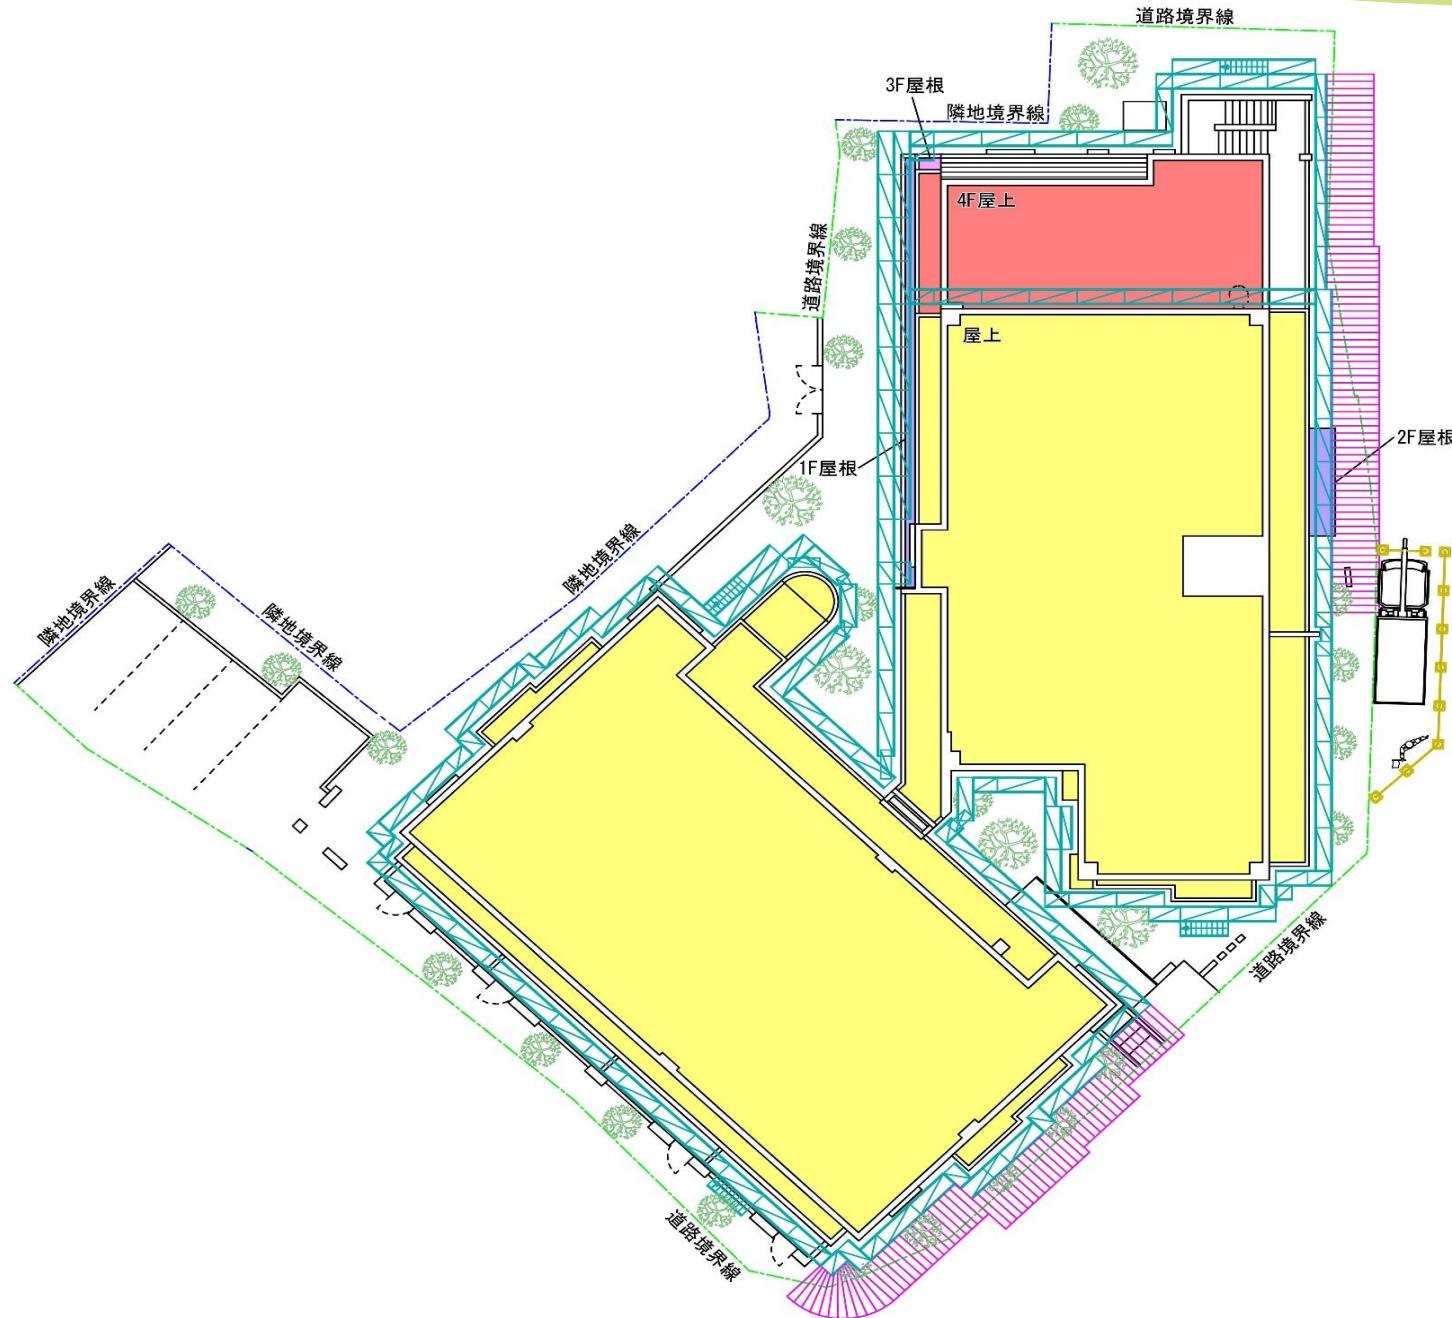


足場設置



開口部水平養生



エントランス透視図



エントランス内に設置予定



工事用掲示板



賃貸物件借用イメージ

現場事務所は近隣賃貸を
借用いたします。



仮設資材置場



仮設トイレ



仮設排水設備



仮設廃材置場

安全誘導員（ガードマン）の配置

足場の組立・解体の際はガードマンを適宜配置いたします。
作業内容によりご通行の妨げになる場合もございますが、
ガードマンが安全を確保し誘導いたします。



【イメージ（ガードマンの誘導）】

植栽仮置き場の設置

着工前アンケートの結果に基づき、バルコニー等の植栽の仮置き場を
設置させていただきます。
植栽への水やり等は居住者様にてお願いいたします。



【イメージ（植栽仮置き場）】

工事用掲示板の設置


エントランス内に工事用掲示板の設置を予定しています。工事内容や進捗状況、お願い事項等のご連絡を掲示いたします。また、工事に関するアンケートやご意見を回収するポストを設置します。工事に関するご要望の投書にも活用ください。



【イメージ（工事用掲示板・工事用ポスト）】

工事のお知らせチラシ

掲示板に各種工事のお知らせを掲示いたしますのでご確認ください。重要なお知らせは、各居戸のポストへの投函も行います。




チラシを配布するもの

- ・ 居住者様にご注意いただく工事のお知らせ
- ・ 工事日程の変更や延長のお願い
- ・ アンケート調査
- ・ その他個別にお知らせしたい事項

【イメージ（工事のお知らせチラシ）】

洗濯物情報


工事期間中は洗濯物が干せない日があります。
 関連情報を掲示する他、事前に洗濯物が干せない日をお知らせします。

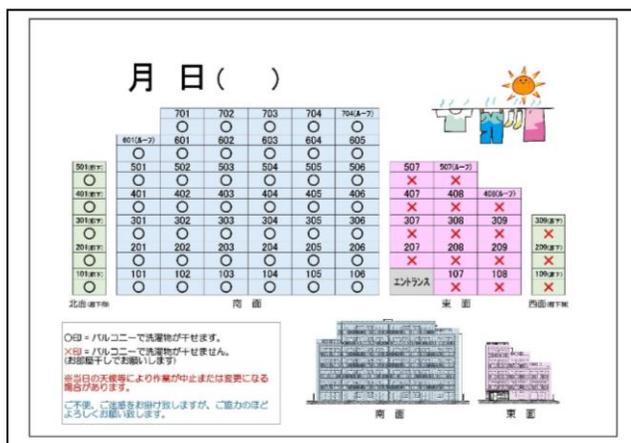

【イメージ (洗濯物情報)】

工程表

各工事の日程を記した表を掲示します。
 工事の種類により、居住者様への注意点が異なる場合がありますので、事前のご確認をお願いします。

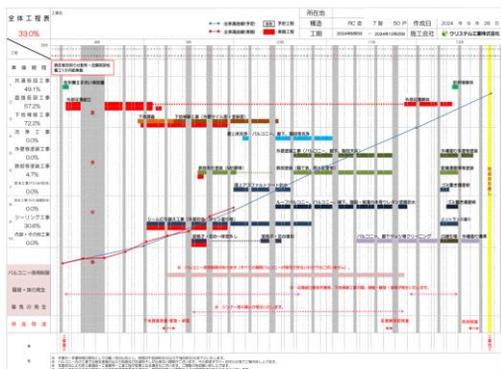

【イメージ (全体工程表)】



【イメージ (週間工程表)】

アフターメンテナンス After-service

アフターメンテナンスサービスとしてお引渡し後に定期点検を行い管理組合様にご報告します。
万一瑕疵が見つかった場合は、早急に対応します。

工事種目	保証内容	保証期間	アフターメンテナンス			
			1年	3年	5年	7年
下地補修工事	剥離、剥落、ひび割れ、浮き、鉄筋錆垂れ露出等	5年	○	○	◎	
シーリング工事	破断、漏水、著しい変退色、硬化不良	5年	○	○	◎	
外壁塗装工事	著しい剥離、変退色	7年	○	○	○	◎
天井面塗装工事	著しい剥離、変退色	3年	○	◎		
鉄部塗装工事	著しい剥離、変退色	3年	○	◎		
バルコニー防水工事	剥離、破断、漏水、著しい変退色	5年	○	○	◎	

< 適用除外項目 >

1. 天災など予測できない不可抗力的な原因によって発生した不良箇所（施工者の責任とされない人為的災害によって生ずるものも含む）
2. 引渡し後、弊社以外の別途業者の作業などによって発生した不良箇所
3. メンテナンスなどにより故意、あるいは不注意に起因した不良箇所
4. 構造体の変位に起因した不良箇所
5. 施主の指示などに基づいて工事をしたことにより発生した不良箇所
6. その他、その補修責任を業者に帰することができない場合
7. 防水層の補修を弊社以外の別途業者が施工をした場合



お引渡し時に材料メーカー連名の保証書を発行します

塗料材料の保証年数について

アステックペイントは会員制で、弊社と取引がある商社並びに塗装業者では取扱いができない為、同等仕様の他メーカー（エスケー化研）でご提案させていただきます。

材料名及び保証年数

○外壁塗装

水性クリーンタイトSi（保証7年）

○鉄部塗装

クリーンマイルドシリコン（保証3年）

○上裏

ノキフレッシュ（保証3年）

○シングル葺き

水性シングルサーフ（保証なし）

※保証書は工事会社とメーカーの連名でご提出します。

アフターメンテナンスフロー

※スケジュールは目安です。補修内容により前後します。

各住戸バルコニー

共用部

ご案内とアンケート用紙の掲示と配布

保証起算日より完工後満1年

アンケート用紙の回収

調査実施(バルコニー・共用部並行)

補修実施日のご連絡

補修作業の実施(バルコニー・共用部並行)

補修完了(完了報告書の作成・提出)

完工後
満1年より
約1ヶ月前

完工後
満1年より
約1週間後

約2週間後



【イメージ (アフター点検完了報告書)】

安心して工事をお任せいただけるよう
3つの保険に加入しています

1.工事履行保証への加入

MKS.A完成保証制度(工事完成までの履行保証)

**受注から完成までの履行が
できなかった場合の保険です**

弊社は、国土交通省の住宅リフォーム事業者団体登録制度の登録団体である一般社団法人マンション計画修繕施工（MKS.A）に加盟しています。

万が一、**受注した工事が何らかの理由で継続不可能となった場合に
当初の契約金額の範囲内で、協会に加盟する別の工事会社はその工事を
完成させることが保証されています。**

これにより、マンション管理組合様は予算内で安心して工事を完了させることができます。



2.賠償責任保険・損害保険への加入

工事の第三者に対する保険です

賠償責任保険…第三者賠償責任保険に加入

工事中の事故の保証をする保険で下記3つを合わせて
最大10億円の保証が支給されます

○請負賠償責任保険

工事中に起きた事故に対して保証する保険です。

例) 資材が落下して人や物に対して事故があった場合など

○施設賠償責任保険

工事中に起きた施設の事故に対して保証する保険です。

例) 資材置き場に子供が入り込み怪我をした場合など

○生産物賠償保険

工事引渡し後の事故に対して補償する保険です。

例) 施工の不具合で雨水が室内に侵入し

家財などを汚してしまった場合など

損害保険…法定外労災保険に加入（労災保険の他）

○業務中傷害保険

業務中傷害保険は、従業員が仕事や通勤中に負った

怪我や病気に対する治療費や休業補償を提供する保険です。

3.大規模修繕工事瑕疵保険への加入

工事後の瑕疵に対する保険です

大規模修繕工事瑕疵保険

弊社は株式会社住宅あんしん保証に登録しています（政府公認）

「大規模修繕工事瑕疵（かし）保険」とは、大規模修繕工事において施工ミスや不具合（瑕疵）があった場合に、その修繕費をカバーする保険です。

保険の対象となる施工部分に瑕疵があった場合、弊社が修理を行います。万が一弊社が履行できなかった場合でも、保険会社が発注者に保険金をお支払いいたします。

マンション管理組合などが予期しない追加費用を負担せずに済むというメリットがあります。



仮設工事

仮設工事は安心安全な工事を行うために必要不可欠です。
居住者様の生活に十分に配慮した施工を心がけます。

※画像はイメージです

1 共通仮設工事

施工をする為に必要な仮設物を設置する工事です。資材置場や廃材置場、水や電気を引く費用、清掃や安全対策費も含まれます。



仮設倉庫



廃材置場



仮設排水設備

2 直接仮設工事

建物に足場を設置する工事です。

施工中の塗料や破片、埃の飛散防止のメッシュシート張り
落下防止の各種養生をいたします。



メッシュシート



足場組立

その他本工事の主な施工箇所

3 下地補修工事(塗装面)



汚れやひび割れの劣化が見られます。

【フィラー擦込み】



ケレン清掃



フィラー擦り込み



施工完了

【Uカットシーリング】



マーキング



Uカット



シール材充填



モルタル充填

3 下地補修工事(タイル面)



汚れや浮き、ひび割れの劣化が見られます。

【タイル貼替補修工事】



カッター入れ

タイル斫り

新規タイル貼り

目地モルタル詰め

【タイル浮き部樹脂注入補修工事】



穴開け

清掃

エポキシ注入

ステンレスピン挿入

4 シーリング工事



シーリングの劣化が見られます。



【イメージ(注意喚起)】

【シーリング工事】



既存撤去 (カッター入れ)



既存撤去



シーリング材充填



ヘラ成形



施工完了

5 外壁塗装工事



汚れや劣化が見られます。

【外壁塗装工事】



施工前



下塗り



中塗り



上塗り

6 鉄部塗装工事



発錆や剥がれ等の劣化が見られます。

【鉄部塗装工事】



施工前



ケレン・清掃




錆止め塗布



中塗り塗布



上塗り塗布

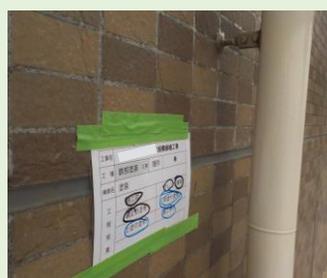

施工完了

7 防水工事




汚れや防水層の劣化が見られます。

【高圧水洗浄】


バルコニー、出窓・窓付庇天端



施工前



高圧水洗浄



施工完了

【ウレタン塗膜防水】

バルコニー

(A棟南面・B棟東面の床は長尺シート張り替え)



施工前



プライマー塗布



ウレタン塗布1回目



ウレタン塗布2回目



トップコート塗布



施工完了

【ウレタン塗膜防水】

出窓・窓付庇天端



施工前



プライマー塗布



ウレタン塗布1層目



ウレタン塗布2層目



トップコート塗布



施工完了

8 その他工事

サッシ・ガラスクリーニング、廊下アルミ目隠し面格子脱着等を行います。


【ガラスクリーニング】



施工前



クリーニング



施工完了

この度はご多忙の折、弊社のプレゼンテーションに
お時間をいただきまして誠にありがとうございました。

弊社は、創業82年にわたる豊富な実績と経験を基盤に
多様なニーズにお応えするとともに、高品質な施工を
お届けすることを第一に取り組んでまいりました。

今後も確かな技術力と信頼を礎に、皆様にご満足いただける
最適なお提案とサービスの提供を続けてまいります。

引き続き、末永くご愛顧賜りますよう

何卒よろしくお願い申し上げます。



クリスタル工業株式会社

代表取締役 **吉岡 諒伍**

2024年12月吉日

MEMO

